Príloha č. 1

Prehľad aktivít OSÚRaRP 2022 - 2023

Odbor stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov

BRATISLAVSKÝ KRAJ



SPRACOVATEĽSKÝ KOLEKTÍV

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK
pod vedením Mgr. Barbory Lukáčovej

Oddelenie riadenia projektov
pod vedením Ing. Ivana Magáta

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK)
pod vedením Ing. Matúša Krnčoka

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
pod vedením Mgr. Tomáša Telekyho

Bratislavský samosprávny kraj
© 2023

OBSAH

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY 5

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 5

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 5

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji 7

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická 9

DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave 11

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok 13

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda 16

Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 16

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava 17

Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo 19

Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 21

Ecoregion SKAT – Kaštieľ Čunovo 21

Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava 22

HERITAGE SK-AT 25

MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území 27

RegioCoop SK-AT 29

Operačný program Efektívna verejná správa 32

Smart región BSK 32

LIFE IP 34

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP 34

PREDLOŽENÉ PROJEKTY 37

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 37

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji 37

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY 37

Plán obnovy a odolnosti SR 38

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora budov 38

Budovanie cyklotrás I. etapa Vinohradnícka 40

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka 42

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave) 43

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska 45

Program Slovensko 2021-2027 (EŠIF) 47

Kampus športu a zdravia v Petržalke 47

Zdravotnícky kampus Bory 49

Projekty budovania kampusov 50

Projekty rozvoja Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) 51

Obchvat Malokarpatského regiónu - II/502 Obchvat Pezinok 52

Obchvat Malokarpatského regiónu – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Pezinok, Grinava) 53

Obchvat Malokarpatského regiónu – II/502 Obchvat Modra 54

Obchvat Malokarpatského regiónu - ostatné úseky (II/502 Obchvat Svätý Jur, II/502 Pezinok - Modra, II/502 Obchvat Dubová, II/503 Obchvat Viničné) 55
Cyklotrasa Zálesie – Most pri Bratislave 55
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 57
Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum 57
Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Gajary a Dürnkrut 59
formou cyklolávky cez rieku Morava 59
Revitalizácia kaštieľskeho parku v Stupave 60
Rozvoj turistickej destinácie Morava 60
PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SK-HU 62
Revitalizácia Malinovského parku 62
Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy 64
UKONČENÉ PROJEKTY 66
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 66
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21 66
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1 69

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 2014-2020

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmnicova 1“), vrátane obstarania nového materiálno – technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Harmincova 1;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 432 122,64 EUR (v zmysle dodatku č.5 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 171 606,13 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 1 389 681,00 EUR (stavebné práce vrátane rezervy, bežné a kapitálové výdavky , na obstaranie materiálno-technického vybavenia vrátane rezervy, autorský a stavebný dozor)

Trvanie projektu: 05/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_2 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Začiatok realizácie stavebných prác 26.10.2020

- Trvanie realizácie stavebných prác 12 mesiacov v zmysle Zmluvy o dielo
- Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa predĺžila lehota na realizáciu stavebných prác do 31.01.2022
- Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo sa predĺžila lehota na realizáciu stavebných prác do 31.03.2022.
- Celková výška naviac prác je 95 910,27 eur s DPH
- Dňa 14.01.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo na obstaranie laboratórneho nábytku
- Dňa 28.01.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo na obstaranie technológie "Cukrár-Pekár"
- Kúpna zmluva na obstaranie výpočtovej techniky bola podpísaná dodávateľom, aktuálne prebieha podpisový proces na BSK
- Prebieha hodnotenie ponúk na obstaranie technológie "Mäsovýroba - Kuchyňa
- Predpokladaný termín vyhlásenia opakovaného verejného obstarávania na nákup špeciálnych laboratórnych prístrojov je 20.02.2023.



Zrekonštruovaný objekt na Harmincovej ulici č.1

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruujú jestvujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k jestvujúcemu objektu a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy, pracoviska Zálesie;
2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 441 934,48 EUR (v zmysle dodatku č.5 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 172 096,72 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 2 985 059,00 EUR (stavebné práce, bežné a kapitálové výdavky na dofinancovanie materiálno-technického vybavenia školy, autorský a stavebný dozor

Trvanie projektu: 07/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Aktuálny stav:

- Začiatok realizácie stavebných prác 06.11.2020
- Trvanie realizácie stavebných prác 20 mesiacov t.j. 06/2022
- Práce boli odovzdané pre zmluvným termínom ukončenia dňa 14.04.2022
- Dňa 13.04.2022 nadobudol účinnosť dodatok č.4 Zmluvy o dielo
- Dňa 15.09.2022 nadobudli účinnosť 3 Kúpne zmluvy so spoločnosťou Equistyle na dodávku jazdeckého vybavenia pre kone (zariadenie do kováčskej dielne, sedlá, trenažér). Predmetné vybavenie bolo dodané.
- Dňa 6.10.2022 nadobudla účinnosť Kúpna zmluva s firmou Agra, ktorej predmetom bolo dodanie poľnohospodárskych strojov (traktor, vlečka, multikára, šmykom riadený nakladač). Predmetné poľnohospodárske stroje boli dodané.
- Zvyšné VO na obstaranie MTV sú v štádiu vyhodnocovania resp. pred vyhlásením VO



Jazdiareň



Viacúčelová odborná učebňa

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;

Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 665 041,47 EUR (v zmysle dodatku č.1 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 183 252,07 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 723 351,14 EUR (stavebné práce nad rámec Zmluvy o NFP vrátane rezervy na nepredvídateľné výdavky,)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku nadobudla účinnosť 25. 06. 2022
- Aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce na objekte školy v zmysle zmluvy o dielo (ďalej ako “ZoD”), ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.07.2022. Lehota výstavby v zmysle ZoD je 08/2023
- Aktuálne prebieha VO na obstaranie materiálno-technického vybavenia



Rekonštrukcia poschodia



Fasáda, lešenie, okná

DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPS Rača“ dôjde **k skvalitneniu sociálnej služby** na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa. a II.etapa
2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.

Výstupy projektu:

- Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer, Projekt skutočného vyhotovenia
- Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
- Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Rozpočet projektu:	2 019 452,81 EUR (v zmysle dodatku č.4 Zmluvy o NFP)
Spolufinancovanie BSK:	100 972,64 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK za Strelkova II. etapa:	212 198,47 EUR
Dofinancovanie BSK za práce naviac:	
Račianska	39 767,61 EUR
Strelkova	233 881,72 EUR

Trvanie projektu: 08/2020 – 08/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_2 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)

Aktuálny stav:

- Stavebné práce na oboch stavbách sa ukončili v priebehu minulého roka. Novostavba Račianska bola odovzdaná zhotoviteľom k 08/22, kde sa medzičasom nainštalovala kuchynská linka so spotrebičmi, vstavané skrine, madlá a postupne sa dopĺňa o ďalšie potrebné kusy nábytku. Zároveň prebieha kolaudácia stavby.
- Rekonštrukčné práce na Strelkovej sa ukončili a dielo bolo odovzdané k 12/22. V súčasnosti sa kompletizuje dokumentácia na predloženie žiadosti o kolaudáciu.
- V priebehu úvodných kvartálov sa zabezpečia ďalšie časti materiálno-technologického vybavenia oboch stavieb (napr.: nábytok na mieru Strelkova, zdvíhacie zariadenie a technológiu práčovne)



Rekonštrukcia Strelkova 2



Výstavba Račianska 105

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová
5. Debarierizácia rodinného domu v Modre
6. Zriadenie bezpečného prechodu v križovatke Hlavná - Zámocká v obci Častá

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstupy projektu:

- Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
- Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
- Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
- Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
- Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Rozpočet projektu:	3 913 708,04 EUR	
Spolufinancovanie BSK:	195 685,40 EUR (5%)	
Dofinancovanie BSK za naviac práce:	Dubová:	315 248,50 EUR
	Častá:	11 097,74 EUR
	Kráľová:	119 854,75 EUR

Trvanie projektu: 06/2020 – 06/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_1 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)

Aktuálny stav:

- Rodinný dom v obci Častá bol skolaudovaný 04/22. Zároveň boli namontované atypické prvky interiérového vybavenia. Kým dôjde k registrácii služby, bude budova plne zariadená. K vyvolaným investičným aktivitám stavby patrí úprava križovatky Hlavná a Zámocká za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov neďaleko MEREMA-Častá. Križovatka bola ukončená v spolupráci so samosprávou obce 11/22.
- Od 08/22 sa opätovne spustili stavebné práce na dostavbe rodinného dvojdomu v obci Dubová. Predpokladané ukončenie novostavby je 06/23.
- Rekonštrukčné práce na objekte v Modre – Kráľová postupujú podľa predlženého harmonogramu do 04/23.



Novostavba Častá



Novostavba Dubová



Rekonštrukcia Kráľová

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Základné informácie:

Rýchly rozvoj suburbanizácie v Bratislave viedol k nárastu počtu osôb, ktoré sa každodenne prepravujú medzi zázemím a mestom. Intenzívne prepravné toky a preferencia využívania osobných automobilov spôsobujú pravidelné preťaženie dopravných komunikácií medzi mestom a zázemím, ako aj vo vnútri mesta. Na základe vyššie uvedenej situácie vznikla potreba vytvoriť prepojenie východného suburbanizačného pásu Bratislavy na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") čím dôjde k rapídnemu zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Aktivity BSK:

Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a cestou III/1059.

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Rozpočet projektu: 4 849 368,13 EUR
Spolufinancovanie BSK: 242 468,41 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK: 1 807 568,45 EUR

Trvanie projektu: 09/2021 – 12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1 pod názvom „Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - Modra“

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 293/2020 zo dňa 11.09.2020.

Aktuálny stav:

- Dňa 03.10.2020 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie č. OU-SC-OCDPK-2022/016313/NIZ, ktorým sa povolilo užívanie cesty II/127 (úsek MÚK Triblavina - III/1059).

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Základné informácie

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

Aktivity BSK:

1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020
2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov
5. Propagácia a publicita programu
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force)
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj)
9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu
10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Výstupy projektu:

- Množstvo odkonzultovaných projektov
- Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
- Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste
- Databáza kontaktov
- Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov

Rozpočet projektu: 93 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 4 650,00 EUR (5%)

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_1 „Projekt Info bod SK-HU “

Aktuálny stav:

- Podobne ako v predchádzajúcom roku, tak aj v roku 2022 sa Informačný bod sústredil prevažne na aktivity súvisiace s programovaním budúceho programového obdobia 2021-2027. V roku 2022 nebola vypísaná žiadna výzva na predkladanie projektov vzhľadom na dočerpanie celej alokácie Programu. V lete roku 2022 bola vyhlásená posledná výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty pre západnú prihraničnú oblasť, v trvaní jedeného mesiaca 24.06.2022 – 24.06.2022. Začiatkom roka 2022 bol sfinalizovaná migrácia dát do nového monitorovacieho systému Interreg +, čiže bolo možné začať podávať žiadosti o platbu a bolo nevyhnutné doplniť chýbajúce, ktoré kvôli nefunkčnému systému neboli podané.

Aktivity Info bodu:

- V priebehu roka 2022: 13x monitorovanie písomných procedúr Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU
- V priebehu roka 2022: 7x monitorovanie písomných procedúr Fondu malých projektov
- V priebehu roka 2022: 3x stretnutie odbornej komisie EZÚS RDV.
- Január 2022: Prezentácia programového dokumentu, prioritných osí a špecifických cieľov v rámci OSÚRaRP. Následný brainstorming a kreovane projektových zámerov do programov cezhraničnej spolupráce.
- Február 2022: Online stretnutie s vedúcou technického sekretariátu ohľadom poskytnutia dát k indikátorom v rámci tematickej oblasti regionálny cestovný ruch.
- Máj 2022: Organizácia interného stretnutia členov BSK, ktorí pôsobia aktívne pôsobia v EZÚS RDV
- Máj 2022: Sprevádzanie pracovníkov technického sekretariátu programu Interreg SK-HU, ktorí prišli osobne zmonitorovať výstupy projektu Danube Bike and Boat – objavte Dunajské ostrovy
- November 2022: Rozhovor so spoločnosťou CESCI: Informačné body a člen monitorovacieho výboru (úlohy, pracovná záťaž počas programového obdobia, nápady na zlepšenie)
- November 2022: Online stretnutie s EZÚS RDV. Prezentácia projektových zámerov, do ktorých sa EZÚS plánuje zapojiť s aktivitami.
- December 2022: Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci BSK: Prezentácia možností čerpania externých zdrojov z programov cezhraničnej spolupráce. Prezentácia prioritných osí, špecifických cieľov, konzultácií a aktuálneho stavu nového programu 2021-2027.
- December 2022 1x stretnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU



Máj 2022: Sprevádzanie pracovníkov technického sekretariátu programu Interreg SK-HU pri monitoringu výstupov projektu Danube Bike and Boat – objavte Dunajské ostrovy.

Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Predmetom projektu bude revitalizácia záhrady Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade budú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené enviro-vzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.

Aktivity BSK:

1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôsobenie na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny: mládež - žiaci škôl; obyvatelia Bratislavy ako aj celého kraja – najmä rodiny s deťmi; záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; návštevníci územia regiónu; domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

- Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
- Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
- Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
- Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva regiónu

Celkový rozpočet projektu: 1 950 0000,00 EUR

Rozpočet BSK: 1 100 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 55 000,00 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 16 159,96 EUR

Trvanie projektu: 11/2020 – 06/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 198/2019 zo dňa 08.11.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Aktuálny stav:

- Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi revitalizácie záhrady dňa 10.06.2021
- Envirotematické vzdelávacie programy boli zrealizované v priebehu roku 2022. Oslovených bolo až 120 škôl kraja, do súťaže o programy sa zapojilo 19 škôl. Celkovo sa na programoch zúčastnilo 125 žiakov základných škôl zo Slovenska a 58 žiakov z prihraničných maďarských škôl.





Záhrada za NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti



Vizualizácia budúceho areálu Ekocentra

Ecoregion SKAT – Kaštieľ Čunovo

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických zaujímavostiach.

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny: mládež - žiaci škôl; obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

- Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
- Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
- Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne

Celkový rozpočet projektu:	5 183 016,59 EUR
Rozpočet BSK:	3 183 241,05 EUR
Spolufinancovanie BSK:	159 162,05 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK:	528 346,80 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 10/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 160/2019 zo dňa 14.06.2019.

Aktuálny stav:

- Kaštieľ bol odovzdaný zhotoviteľovi dňa 10.06.2021.
- Stavebné práce, ktoré sa zrealizovali (sanácia a podchytenie základov, inžinierske siete, umiestnenie retenčných nádrží, spevnené plochy na parkovanie, zrekonštruované podkrovie - nová strešná krytina, oceľová väzba, zateplenie, podlahy)
- BSK prevzal dokument Koncepcia inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne, ako jeden z výstupov projektu. Dokument stanovuje modely spolupráce v prihraničnom regióne.



NKP Kaštieľ Čunovo v pôvodnom stave



NKP Kaštieľ Čunovo počas rekonštrukcie



NKP Kaštieľ Čunovo počas rekonštrukcie

Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Základné informácie:

Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými uzlami, sa obyvateľom žijúcim na obidvoch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skráti čas dochádzky na priľahlé železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v plánovanej cezhraničnej oblasti.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Vysoká pri Morave a Marchegg
2. Realizácia doplnkovej infraštruktúry
3. Vybudovanie cyklodopravných prepojení na najbližšie ŽS
4. Medzinárodný Bike event pri slávnostnom otvorení cyklolávky

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom území, domáci a zahraniční návštevníci.

Výstupy projektu:

- Úspora času v doprave vybudovaním nových cezhraničných prepojení
- Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
- Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Celkový rozpočet projektu:	5 912 800,00 EUR
Rozpočet BSK:	2 170 800,00 EUR
Spolufinancovanie BSK:	108 540,00 EUR (5%)
Dofinancovanie:	**235 525,83 EUR**

Trvanie projektu: 06/2017 - 10/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt bol zaradený do AP BSK 2022 č. OSÚRaRP_9 pod názvom „Cezhraničné prepojenia územia formou cyklolávok cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg)“.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 51/2018 zo dňa 15.06.2018.

Aktuálny stav:

- Dňa 07.05.2022 bola cyklolávka VysoMarch slávnostné otvorená pre verejnosť



Osadenie oceľovej časti mostnej konštrukcie

Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivity s AT)
5. Marketingové aktivity

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry; amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovoumelecké súbory a súbory ZUČ); relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO), osvetoví pracovníci; vinári a vinohradníci; cechy; obyvatelia BSK; návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Celkový rozpočet projektu:	3 659 789,20 EUR
Rozpočet BSK:	2 125 313,46 EUR
Spolufinancovanie BSK:	106 265,67 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK:	60 999,03 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 – 7/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry,

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OK_5 pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Aktuálny stav:

- Zrealizoval sa nákup vybavenia a techniky pre potreby kultúrno-kreatívneho centra
- Rekonštrukčné práce na budove kaštieľa boli ukončené
- Prebieha digitalizácia umeleckých predmetov s historickou hodnotou
- Prebieha revitalizácia záhrady



Stav nádvoria pred rekonštrukciou



Nádvorie po rekonštrukcii

MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Základné informácie:

Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít. Na Slovensku sa naďalej využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú zdravotné riziká, môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Naopak na rakúskej strane združenie 9 obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaja od r. 2012 úspešne vykonáva tzv. biologickú reguláciu komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti. Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj. celkovým cieľom projektu posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom regionálnej a cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov.

Aktivity BSK:

1. Vytvorenie cezhraničných digitalizovaných topografických a hypsometrických máp liahnísk komárov ako základný nástroj ovplyvňujúci presnosť zásahov biologickej regulácie komárov;
2. Vytvorená a otestovaná spoločná webová aplikácia a digitálny systém na zaznamenávanie/vyhodnocovanie dát;
3. Cezhraničný systém včasného varovania založený na ArcGIS prístupný 50 pracovníkom vo všetkých zapojených organizáciách;
4. Sieť minimálne 40 vyškolených dobrovoľníkov a pracovníkov samosprávy;
5. Pilotné testovanie rôznymi formami aplikácie na 130 ha územia (spolu za roky 2021 a 2022);
6. Všetky zariadenia používané na biologickú reguláciu komárov (postrekovače, drony, dávkovač na helikoptéru) budú presne nastavené (kalibrované) na príslušné dávkovanie tak, aby boli dodržané environmentálne normy.

Relevantné cieľové skupiny: populácia v cezhraničnom regióne, zainteresované skupiny z oblasti ochrany biodiverzity.

Výstup projektu:

Digitalizované mapy všetkých liahnísk komárov - na základe existujúceho digitalizovaného kartografického materiálu z 3 oblastí sa spracujú hypsometrické mapy s využitím údajov z radarového skenovania. Následne vyškolení odborníci vykonajú intenzívne terénne mapovanie potenciálnych liahnísk komárov, pričom výsledkom bude súbor digitálnych máp s funkčnými jednotkami liahnísk komárov. Na základe uvedených krokov mapovania tím GIS na BSK v spolupráci s Verein Biologische Gelsenregulierung vytvorí spoločnú digitálnu platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov. Platforma umožní efektívne a včasné plánovanie zásahov. Na tomto základe sa zrealizuje prísne organizované a štandardizované testovanie všetkých používaných regulačných zariadení a foriem Bti. Pilotné testovanie metodiky a vybavenia/materiálov sa uskutoční v nive po záplavách v prvom a druhom roku s použitím dvoch rôznych zložení BTI (granulát a rozpustný prášok).

Rozpočet BSK: 279 856,11 EUR

Spolufinancovanie BSK: 13 992,81 EUR (5%)

Trvanie projektu: 04/2021 – 08/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt bol zaradený do AP BSK 2022 č. OÚPGISaŽP_4A „Biologická regulácia komárov“

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 321/2020 zo dňa 18.12.2020.

Aktuálny stav:

- V priebehu realizácie projektu bol vysúťažený Softvér pre digitálnu platformu projektu, čo zahŕňa Licencie na softvér ArcGlS for Desktop _ Standard a ArcGIS for Server - Advanced
- V nadväznosti na zakúpené licencie bolo potrebné vysúťažiť dodávateľa na Webovú GIS platformu pre projekt, ktorá vytvorí spoločnú digitálnu webovú koordinačnú platformu, vrátane mobilnej aplikácie - rozhrania pre terénnych pracovníkov, biológov a ostatných zapojených strán v projekte Mosquito Bioregulation. Súčasťou platformy bude aj tematická trojjazyčná web stránka (Hub) pre potreby zobrazovania zaznamenaných údajov a informovanosti verejnosti. Táto platforma bude základom pre systém včasného varovania, ktorý významne pomôže pri koordinácii projektových partnerov v prípade predikcie záplav a zaplavených území, plánovaní a realizácii zásahov na celom záujmovom území.



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie a podporiť regionálny kooperačný manažment. Výsledkom budú zadefinované strategické témy pre cezhraničnú spoluprácu a preskúmajú sa prípadné prekážky pre jej realizáciu a tým sa prispieva aj k lepšiemu zacieleniu finančnej podpory cezhraničného programu. To sa dosiahne prostredníctvom posilnenia spolupráce a kapacít cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie prihraničných oblastí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020.

Aktivity BSK:

1. Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
2. Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc
3. Interkulturálne tréningy
4. Záverečná konferencia

Relevantné cieľové skupiny: inštitúcie verejnej správy, regionálne a miestne orgány, obyvatelia prihraničných sídiel

Výstupy projektu:

- Zásobník strategických tém
- Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností
- Správa z prieskumu verejnej mienky
- Cezhraničné workshopy
- Interkulturálne tréningy

Rozpočet BSK: 244 544,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 12 227,20 EUR (5%)

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „RegioCoop SK-AT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 182/2019 zo dňa 08.11.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_1 „Projekt RegioCoop SK-AT“

Aktuálny stav:

- Projektový partner BSK sa v priebehu roka pravidelne zúčastňoval cezhraničných podujatí, ktoré mali za cieľ podporovať tematiku sietí, napríklad workshopy, okrúhle stoly, sprevádzané tematické prechádzky a sieťové stretnutia, ktoré mali za cieľ zvýšiť výmenu medzi tematickými ťažiskami.
- BSK dňa 14.1.2022 prevzal finálnu etapu zákazky *„Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom“* a *„Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností“* vrátane všetkých dokumentov v papierovej aj online podobe a v dvoch jazykových mutáciách (SJ a NJ). Analýza legislatívnych rozdielov predstavuje kľúčový pomocný dokument pre budúcich žiadateľov, ktorej cieľom je včasné prekonanie prekážok pri tvorbe nových projektov, ktoré vyplávajú z odlišných štruktúr a legislatívy oboch krajín.
- BSK organizoval dve podujatia s názvom “*Interkulturálny tréning”,* ktoré boli jedným z hlavných výstupov projektu. Podujatia sa konali dve, prvé sa konalo 26.9.2022 v Bratislave a druhé sa konalo 22.- 23.11.2022 v Modre. Cieľom podujatí

bolo, zlepšiť medzikultúrne zručnosti žiadateľov projektov a organizácií pomáhajúcimi subjektom, ktoré podávajú a implementujú cezhraničné projekty, spoznať charakteristické znaky jednotlivých kultúr, pochopiť kultúrne odlišnosti, ako sa vyhnúť nedorozumeniam medzi jednotlivými kultúrami, pochopiť komunikačný štýl v danej krajine, neúmyselný konflikt a riešenie konfliktov a ďalšie.

- V závere roka partner BSK organizoval záverečnú konferenciu projektu. Záverečná konferencia sa konala v online priestore na platforme ZOOM. V rámci programu projektoví partneri odprezentovali hlavné a najdôležitejšie výstupy projektu, oboznámili účastníkov so všetkými aktivitami a priniesli informáciu o novinkách v rámci nadchádzajúceho programového obdobia.



Prehliadka Bratislavy ako korunovačného mesta Rakúsko-Uhorska



Interaktívny workshop Slovenskej ľudovej majoliky.



Workshop medzikultúrnej komunikácie vedený pani Gáboríkovou, skúsenou medzikultúrnou konzultantkou a koučkou.

Smart región BSK

Základné informácie:

Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt "Smart región BSK". Cieľom projektu "Smart región BSK" je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.

Aktivity BSK:

1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade BSK
2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu BSK

Výstupy projektu:

- Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
- Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík:
    - Dátová analýza na Úrade BSK
    - Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky “Social Progress Index”
    - Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK
    - Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK
    - Bratislava SMART Region (SMART stratégia)
    - Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026
    - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026
    - Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
- Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK:
    - Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
- Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov:
    - Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku

Celkový rozpočet projektu: 1 952 010,35 EUR

Spolufinancovanie BSK: 97 600,52 EUR (5%)

Trvanie projektu: 05/2020 – 05/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „ Implementácia stratégie "Bratislava SMART Region" (SMART stratégia)“.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 179/2019 zo dňa 20.9.2019.

Aktuálny stav:

- 01.05.2020 bol v rámci Úradu BSK zriadený Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
- Úspešne vypracované dokumenty:

- Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK - tvorba dokumentu ukončená 14.11.2021
- Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK – tvorba dokumentu ukončená 09.10.2021
- Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát - tvorba dokumentu ukončená 09.01.2022
- Social Progress Index (Index sociálneho pokroku) - tvorba dokumentu ukončená 17.01.2022
- Stratégia Bratislava SMART Region - tvorba dokumentu ukončená 14.06.2022
- Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025 - tvorba dokumentu ukončená 04.08.2022

- 02. - 05.10.2022 sa uskutočnil workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku
- Aktuálne prebieha dokončovanie nasledujúcich dokumentov:
  - Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
  - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026
  - Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)



Zástupcovia BSK vo Fínsku, 04.10.2022

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Základné informácie:

Projekt **LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia** sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Aktivity BSK:

1. Zapojením sa BSK do projektu LIFE IP získa finančnú aj kapacitnú podporu pre zriadenie pozície manažéra kvality ovzdušia na obdobie 2022-2027, t.j. na 6 rokov. Manažér kvality ovzdušia bude mať za úlohu koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne

2. Relevantné cieľové skupiny: Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Výstup projektu:

- personálne zabezpečenie manažéra kvality ovzdušia. Jeho úlohu je koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne, a to predovšetkým:
- poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni
- monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja
- návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou
- podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia
- zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou komunikačných stratégii pri zavádzaní nových opatrení do praxe
- priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia
- poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
- prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov - spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia
- vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií
- prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a vykurovania domácností

Rozpočet projektu: 322 348,20 EUR

Spolufinancovanie BSK: 32 234,82 EUR (10%)

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt bol zaradený do AP BSK 2022 č. OSURaRP_5 pod názvom „LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia“

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 390/2021 zo dňa 11.06.2021.

Aktuálny stav:

- Od 04/2022 obsadená pozícia manažéra kvality ovzdušia
- Absolvovanie rôznych školení manažéra kvality ovzdušia na rozšírenie vedomostí a zručností (kvalita palivového dreva, vykurovacie zariadenia, modelovanie v programe Atmoplan, termografické meranie budov, zážitková pedagogika, dizajn manuál, mechanizmus dotácie na obnovu domov, vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva, pasívne merače na vzdelávacie aktivity, kurz správneho kuriča, udržateľná mobilita)
- Účasť na rôznych verejných podujatiach s prezentáciou projektu (Deň Európy, Ulice pre deti, Európska noc výskumníkov, Agrokomplex)
- Vzdelávacie aktivity pre žiakov na základných školách (Bratislava, Senec)



Podujatie Deň Európy v Starej tržnici v Bratislave, 09.05.2022



Školenie kvalita palivového dreva v Lieskovci, 12.05.2022



Osvetová aktivita na základnej škole Mlynská v Senci, 20.09.2022

PREDLOŽENÉ PROJEKTY

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 2014-2020

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji

Základné informácie:

Projekt má za cieľ znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete, ale najmä v kontexte súčasnej situácie dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré neboli na túto epidémiu pripravené a materiálovo vybavené.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

- minimalizovať v čo najvyššej miere dopady krízovej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 posilnením kapacít subjektov zdravotníckeho systému;
- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu verejného zdravia;
- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu a bezpečnosť personálu.

Aktivity BSK:

V rámci realizovanej aktivity dôjde k uplatneniu už vynaložených nákladov spojených s prevenciou a ochranou pred šírením ochorenia COVID-19 a nákup nových tovarov spojených s prevenciou a ochranou pred šírením ochorenia.

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia BSK

Výstup projektu:

- Projekt riešiť ochranu verejného zdravia, financovanie opatrení v oblasti prevencie, s dôrazom na materiálno-technické vybavenie, poskytovanie ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok a prispôsobenie pracovného prostredia.
- Podporou týchto aktivít by malo prísť k spomaleniu šírenia nákazy a dôjde k posilneniu odolnosti spoločnosti pred náporom pandémie a bude mať významný prínos na zachovaní dôstojnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti celej populácie.

Rozpočet projektu: 381 721,80 EUR
Spolufinancovanie BSK: 19 086,09 EUR (5%)

Trvanie projektu: 01/2023 – 06/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor zdravotníctva

Aktuálny stav:

- Podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok 30.12.2021
- Žiadosť o NFP schválená

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora budov

Základné informácie:

Hĺbková obnova verejných historických budov je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom budúcich projektov je znížiť energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie, využívaním nových technológií, šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Ciele BSK:

- Dosiahnutie minimálne 30% úspor primárnej energie na základe tepelno-technickej obnovy vybraných objektov vo vlastníctve BSK
- Obnova budov vo vlastníctve BSK pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti
- Zmiernenie dopadov na zmenu klímy

Vybrané budovy vo vlastníctve BSK, financované z externých finančných zdrojov:

- SOŠ Polygrafická
- SOŠ Bullova
- DSS prof. K. Matulaya
- Gymnázium Ivana Horvátha
- Gymnázium L. Novomeského
- Gymnázium Hubeného
- DSS Kampino
- HA Mikovíniho
- OA Račianska
- SPŠ Drieňová
- SŠ Tokajícka

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, užívatelia obnovených budov (stredné školy a gymnáziá, domovy sociálnych služieb)

Výstupy projektu:

- úspora primárnej energie budov
- zateplenie obvodových stien budov
- výmena okien
- zateplenie a nová hydroizolácia striech

Rozpočet projektu: určený na základe vypracovaných projektových dokumentácii s výkazom výmer

Odhadovaný rozpočet projektov: 15 000 000,00 EUR

Trvanie projektov: 03/2023 – 12/2025

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_4 Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK

Aktuálny stav:

- Spracovanie projektových dokumentácií, vrátane passportu, tepelno-technického posúdenia a výkazu výmer
- SOŠ Bullova a Gymnázium Hubeného sú aktuálne v realizácii, obnova SOŠ Polygrafická je v štádiu vyhlásenia VO na zhotoviteľa.

Budovanie cyklotrás I. etapa Vinohradnícka

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Aktivity BSK:

1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklodopravných trás v kraji
2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD
3. Posilnenie integrovaného dopravného systému v kraji

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, dochádzajúci do zamestnania, škôl, dostupnosť cestujúcich na zastávky vlak/BUS za účelom ďalšieho využitia VOD

Výstupy projektu:

- Podpora zdravého životného štýlu
- Podpora nemotorovej dopravy - cyklodopravy
- Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Odhadovaný rozpočet projektu: 1 305 000,00 EUR

Trvanie projektu: 10/2022 – 06/2025 (prebieha predinvestičná príprava)


Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_14 Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur – Pezinok

Aktuálny stav:

- Zber stanovísk a príprava projektu na územné konanie
- Riešenie trasovania k.ú. Svätý Jur

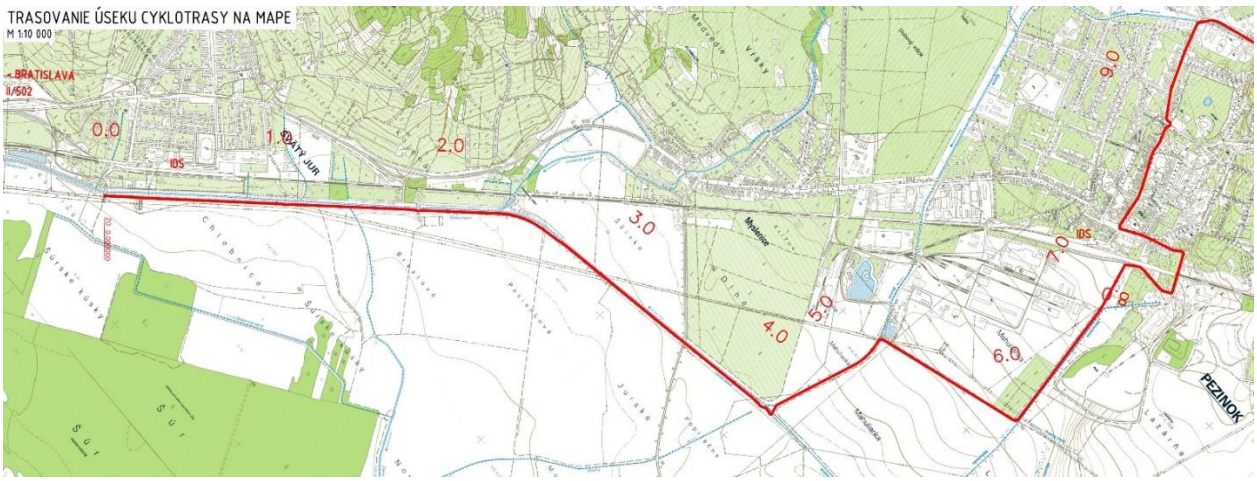

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Aktivity BSK:

1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklodopravných trás v kraji
2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD
3. Posilnenie integrovaného dopravného systému v kraji

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, dochádzajúci do zamestnania, škôl, dostupnosť cestujúcich na zastávky vlak/BUS za účelom ďalšieho využitia VOD

Odhadovaný rozpočet projektu: 715 000,- EUR


Trvanie projektu: 10/2022 – 12/2025 (prebieha predinvestičná príprava)

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_15 Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok – Modra

Aktuálny stav:

- Projektová dokumentácia podaná na územné konanie (stavebný úrad mesta Pezinok)

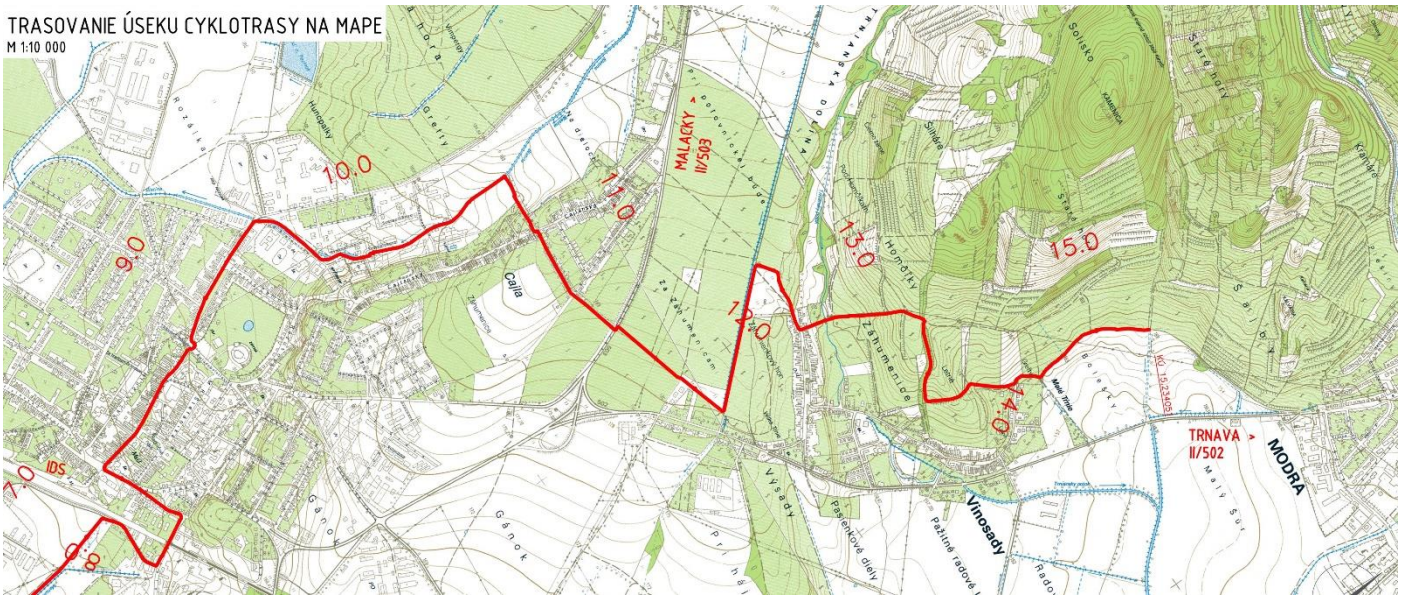

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Základné informácie:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. V rámci projektu bude vybudovaných 5 zariadení integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno - zdravotné zariadenia. Prostredníctvom realizácie projektu bude možné transformovať veľkokapacitné zariadenie sociánych služieb DSS a ZpS kaštieľ v Stupave do nízkokapacitných priestorov (kapacita max. 30 prijímateľov), ktoré rešpektujú súkromie a nároky prijímateľov sociálnych služieb.

Aktivity BSK:

1. Majetkovo-právne vysporiadanie (kúpa) pozemkov za účelom výstavby objektov soc. – zdrav. zariadení;
2. Príprava projektovej dokumentácie výstavby objektov;
3. Príprava a predloženie projektového zámeru;
4. Spolupráca na príprave komplexného návrhu transformácie (obsahovej / prevádzkovej / administratívnej) DSS a ZpS Kaštieľ;
5. Príprava a predloženie žiadosti o príspevok z prostriedkov mechanizmu;
6. Realizácia projektu.

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, komunity, v ktorých budú vybudované zariadenia soc. služieb

Výstup projektu:

Výstavba a uvedenie do prevádzky špecializovaných zariadení poskytujúcich sociálno-zdravotnú starostlivosť

Odhadovaný rozpočet projektu: 25 000 000 EUR

Trvanie projektu: 06/2023 – 12/2026

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor sociálnych vecí; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania; právne oddelenie

Ideový zámer deinštitucionalizácie a transformácie zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave bol schválený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 5/2023 zo dňa 27.01.2023.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_4 pod názvom “Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave “.

Aktuálny stav:

- Majetkovo-právne vysporiadanie (kúpa) pozemkov za účelom výstavby objektov soc. – zdrav. zariadení;
- Príprava projektovej dokumentácie výstavby objektov;
- Príprava projektového zámeru;
- Spolupráca so ZSS na príprave komplexného návrhu transformácie (obsahovej / prevádzkovej administratívnej) DSS a ZpS Kaštieľ.



Vizualizácia dvojpodlažnej stavby pre 30 prijímateľov



Vizualizácia dvojpodlažnej stavby pre 30 prijímateľov

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Základné informácie:

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov s poruchami autistického spektra, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava
2. Vyhotovenie architektonickej štúdie
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie búracích prác a výstavby
4. Búranie práce
5. Výstavba špecializovaného zariadenia

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby špecializovaného zariadenia, zamestnanci, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu:

Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy na Znievskej ulici v Petržalke sa vybuduje moderné zariadenie sociálnych služieb rešpektujúce princípy komunitných sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchami autistického spektra. Zariadenie s kapacitou 24 miest bude poskytovať celoročné a ambulantné sociálne služby.

Odhadovaný rozpočet projektu: 3 800 000,00 EUR

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSV_3 pod názvom „Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD“

Aktuálny stav:

- Architektonická štúdia na ŠZ pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra bola prepracovaná na základe konzultácií s odborníkmi pre poskytovanie sociálnej starostlivosti prijímateľom s obdobnými poruchami, čím došlo k aktualizácii podkladov VO.
- Do zákazky budú navyše doplnené dodatočné búracie práce, ktoré z predchádzajúcej súťaže nemohli byť zrealizované.



Vizualizácia z pôvodnej štúdie

Kampus športu a zdravia v Petržalke

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu (Slovenský zväz ľadového hokeja, HC Slovan Bratislava, Slovenský atletický zväz), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry. Zároveň bude v rámci kampusu vytvorený segment zdravotníckeho vzdelávania, predovšetkým v odboroch asistent výživy, masér a fyzioterapeut, ktoré sú obsahovo prepojené profesionálnou športovou prípravou a vytvárajú priestor pre vedecko-výskumné aktivity v oblasti rehabilitácie a regenerácie športovcov, ako aj v oblasti zdravého životného štýlu a liečby civilizačných ochorení v spolupráci s relevantnými partnermi z akademickej sféry (FTVŠ UK, Biomedicínske centrum SAV). V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom zapojenia nových partnerov a príprava stavebného zámeru a podkladov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
2. Vytvorenie segmentu zdravotníckeho vzdelávania v prepojení na profesionálnu športovú prípravu v rámci Spojenej školy;
3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki športovci širokého spektra športov; športová profesionálna i amatérska verejnosť; obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia BSK na základe princípov konceptu SMART školy, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 25 000 000,00 EUR

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_1 pod názvom „Kampus zdravia a športu v Petržalke“

Aktuálny stav:

- V roku 2022 prebehla príprava podkladov na predloženie návrhu riešenia zmluvných vzťahov, stavebných činností a detailných parametrov projektu - projektový zámer.
- Na základe požiadaviek a potrieb študijných odborov, podľa štátnych vzdelávacích programov, aktuálne prebieha príprava podkladov pre vypracovanie stavebného zámeru ako aj podkladov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.



Architektonická štúdia Kampusu zdravia a športu



Architektonická štúdia Kampusu zdravia a športu

Zdravotnícky kampus Bory

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného zdravotníckeho kampu na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu budú Stredné zdravotnícke školy Strečnianska a Záhradnícke, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá sa bude finančne a odborne podieľať na vybudovaní a prevádzkovaní simulačného centra a investor novej nemocnice Bory – Penta Hospitals International, ktorý v rámci projektu poskytuje pozemok pri novej nemocnici. Cieľom vybudovania Zdravotníckeho kampusu Bory je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu a lekárov, nielen v BSK ale aj v SR. V súčasnosti prebieha analýza študijných odborov, komunikácia s partnermi a príprava podkladov pre vypracovanie Ideového zámeru, ktorý bude predkladaný na rokovanie Zastupiteľstva BSK v marci 2023.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
2. Vybudovanie simulačného centra v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou s komplexnou ponukou metód simulačnej medicíny na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania;
3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka; študenti a pedagógovia SZU; zamestnanci novej nemocnice Bory; obyvatelia a návštevníci lokality Bory; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie novej komplexnej infraštruktúry strednch zdravotníckych škôl pre teoretickú a praktickú výučbu a simulačného centra pre praktickú výučbu simulačnými metódami vysokoškolských študentov medicíny a žiakov stredných škôl.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 25 000 000,00 EUR

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_2 pod názvom „Zdravotnícky kampus Bory“

Aktuálny stav:

- V súčasnosti prebieha analýza študijných odborov, komunikácia s partnermi a príprava podkladov pre vypracovanie Ideového zámeru, ktorý bude predkladaný na rokovanie Zastupiteľstva BSK v marci 2023.

Projekty budovania kampusov

Základné informácie:

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia. Sú založené jednak na prepájaní jednotlivých stupňov vzdelávania, ale aj na partnerstvách so zamestnávateľmi a akademickým sektorom. V novom programovom období 2021-2027 bude budovanie kampusov kľúčovou investičnou prioritou BSK v oblasti školstva, ktorá má prispieť k racionalizácií, optimalizácií a predovšetkým k skvalitneniu siete stredných škôl v BSK. V súčasnosti sú okrem Kampusu zdravia a športu a Zdravotníckeho kampusu identifikované 3 ďalšie potenciálne projekty budovania kampusov:

- Kampus bioenergetiky v Bernolákove
- Vinársko-ovocinársky kampus v Modre
- Kampus umeleckých škôl Gaudeamus

Odhadovaný rozpočet BSK: 25 000 000 EUR

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_6 pod názvom „Rozvoj konceptu SMART školy“

Aktuálny stav:

- Prebieha príprava podkladov pre vypracovanie ideových zámerov projektov budovania jednotlivých kampusov.
- Prebiehajú rokovania s potenciálnym partnermi a rovnako so štátom, ohľadom previazanosti obsahu jednotlivých projektov so stratégiou inteligentnej špecializácie, ktoré je podmienkou pre čerpanie externých zdrojov z Operačného programu Slovensko.

Projekty rozvoja Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP)

Základné informácie:

Centrá odborného vzdelávania a prípravy predstavujú kvalitné vzdelávacie inštitúcie vychovávajúce kvalitný ľudský kapitál podľa požiadaviek praxe. BSK si uvedomuje dôležitosť týchto inštitúcií a ich význam pre odborné a celoživotné vzdelávanie, a preto sa od roku 2016 v oblasti školstva zameriava práve na investičnú podporu COVP, v rámci ktorej bolo zrekonštruovaných 5 COVP v celkovej sume približne 17 mil. €. Tieto projekty investičnej podpory boli zamerané na rekonštrukciu a zveľadenie pracovísk praktického vzdelávania vrátane materiálno-technického vybavenia. Kontinuálna podpora COVP je jednou z priorít župy a v súčasnosti sú identifikované 3 potenciálne projekty rozvoja COVP:

- COVP pre oblasť gastroslužieb a hoteliérstva (Hotelová akadémia Mikovíniho)
- COVP pre oblasť elektrotechniky (SPŠE Hálova)
- COVP pre oblasť beauty služieb (SOŠ beauty služieb Račianska a SOŠ kaderníctva a vizážistiky Svätoplukova)

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_6 pod názvom „Rozvoj konceptu SMART školy“

Odhadovaný rozpočet BSK: 15 000 000,00 EUR

Aktuálny stav:

- Prebieha príprava podkladov pre vypracovanie ideových zámerov projektov rozvoja COVP.

Obchvat Malokarpatského regiónu - II/502 Obchvat Pezinok

Základné informácie:

Preložka cesty II/502 začína severne od mesta Svätý Jur v miestnej časti Brestové, v mieste navrhovanej výhľadovej MÚK Svätý Jur–sever. V k.ú. Grinava mimoúrovňovo križuje cestu III/1083 (Grinava – Slovenský Grob), obchádza vinice za Šúrskym kanálom, mimoúrovňovo križuje budúci koridor regionálnej žel. trate Bratislava – Pezinok, potok Blatina a Viničniansky kanál, v priestore MÚK Viničné je vedená na moste ponad preložku II/503 Viničné obchvat (variant A), ďalej pokračuje v súbehu so vzdušným 2x110 kV elektrickým vedením juhovýchodným obchvatom mesta Pezinok, pričom obchádza bývalé ložisko dobývacieho priestoru tehliarskej hliny Pezinských tehelní, a.s.. V priestore Natalinho majera trasa cesty II/502 mimoúrovňovo - nadcestím križuje existujúcu cestu II/503, ďalej pokračuje až ku MÚK Pezinok-sever. Pri II/503 Viničné obchvat (variant B) nie je v km 3,890 potrebné mimoúrovňovo križovať c.II/503, nakoľko tá je navrhnutá v inej polohe.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie preložky cesty II/502 v Pezinku
2. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
3. Majetkovoprávne vysporiadanie

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 112 115 147,00 EUR

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2030 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu “

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie úseku “II/502 Pezinok- Modra obchvat” a “II/503 Viničné obchvat”.

Obchvat Malokarpatského regiónu – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Pezinok, Grinava)

Základné informácie:

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území. Existujúca cestná sieť je tvorená v prevažnej miere cestami III. Triedy. Problémom je napojenie nových ale i existujúcich urbanizovaných častí obcí na nadradené komunikačné systémy smerom na mesto Bratislava po diaľnici D1. Preto vznikla potreba prepojenia územia na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“) s výhľadom na prepojenie ciest I/61 a II/502, čím by došlo k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou III/1083 (Pezinok – Grinava) .
2. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
3. Majetkovoprávne vysporiadanie

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 15 000 000,00 EUR

Rozpočet BSK: -

Spolufinancovanie BSK: -

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2026 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene – Pezinok, Grinava“

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha proces územného konania, pričom predpoklad vydania územného rozhodnutia je v rámci 2Q/2023. Zároveň prebieha príprava spracovania dokumentácie na realizáciu predmetnej stavby.

Obchvat Malokarpatského regiónu – II/502 Obchvat Modra

Základné informácie:

Preložka cesty II/502 začína cca 129 m východne od hranice zastavaného územia mesta Modra, v križovatke s cestou III/1046. Zprava obchádza areál firmy Bohnenkapm, s.r.o., križuje Procházkov potok, v miestnej časti Šnavdy mimoúrovňovo križuje preložku poľnej cesty a plánovanú cyklotrasu, ďalej stúpa v pozdĺžnom sklone 5,5%, obchádza skládku odpadov, pokračuje cez trávnaté pozemky a končí cca 186 m od východného okraja zastavaného územia Modry - časť Kráľová, v križovatke s cestou II/504 (Trnavská).

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou II/504.
2. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
3. Majetkovoprávne vysporiadanie

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 15 000 000,00 EUR

Rozpočet BSK: -

Spolufinancovanie BSK: -

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2026 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene – Pezinok, Grinava“

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha proces územného konania, pričom predpoklad vydania územného rozhodnutia je v rámci 2Q/2023. Zároveň prebieha príprava spracovania dokumentácie na realizáciu predmetnej stavby.

Obchvat Malokarpatského regiónu - ostatné úseky (II/502 Obchvat Svätý Jur, II/502 Pezinok - Modra, II/502 Obchvat Dubová, II/503 Obchvat Viničné)

Základné informácie:

Základnou podmienkou efektívneho prepojenia mestských a vidieckych prostredí je zabezpečenie potrebnej obslužnosti regiónu prostredníctvom kvalitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry. Cesty II. a III. triedy, aj vďaka absencii dostatočnej železničnej siete a chýbajúcim úsekom ciest I. triedy, zohrávajú nezastupiteľnú funkciu v obslužnosti regiónu ako z hľadiska verejnej osobnej dopravy tak aj individuálnej dopravy. Práve absencia vyššie spomínanej infraštruktúry sa v rámci Bratislavského samosprávneho kraja prejavuje najviac v Malokarpatskom regióne. Z vyššie uvedených dôvodov sa stali cesty II/502 a II/503 hlavnou dopravnou tepnou Malokarpatska s nadregionálnym významom. V zmysle dopravnoinžinierskeho prieskumu realizovaného 05/2022 dosahovala intenzita dopravy na ceste II/502 v niektorých úsekov **viac ako 24 000 voz/24h,** čo predstavuje vyššiu intenzitu ako vykazuje väčšina diaľničných úsekov na severe a východe Slovenskej republiky. V zmysle záverov PUM BSK ako aj iných strategických a technických dokumentov sa prioritným riešením tohto neželaného stavu stal projekt výstavby **cestného obchvatu Malokarpatského regiónu**. Malokarpatský obchvat bude tvoriť kostru cestnej siete v regióne a prinesie markantné zvýšenie kvality cestovania prostredníctvom prímestskej autobusovej dopravy.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie preložky cesty II/502 v úseku Svätý Jur – Pezinok – Modra - Dubová a preložku cesty II/503 v obci Viničné.
2. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
3. Majetkovoprávne vysporiadanie

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 220 819 062,00 EUR

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2030 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu “

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie úseku “II/502 Pezinok- Modra obchvat” a “II/503 Viničné obchvat”.

Cyklotrasa Zálesie – Most pri Bratislave

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch.

Aktivity BSK:

1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklodopravných trás v kraji
2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia Bratislavského kraja a jeho návštevníci

Odhadovaný rozpočet projektu: 844 000,- EUR

Trvanie projektu: 12/2021 – 12/2024 (prebieha predinvestičná príprava)

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_11 Cyklotrasa Zálesie – Most pri Bratislave

Aktuálny stav:

- Prebieha jednanie o vyňatie pozemku pod úsekom cyklotrasy z lesného fondu
- Pripravuje sa schválenie prevodu práv a povinností stavebníka zastupiteľstvom obce Zálesie
- Pripravuje sa schválenie zastupiteľstvom obce Zálesie prenájom pozemku č. KN-C 1361 o výmere 9653 m2, zapísanej LV č. 340, v k.ú Zálesie v prospech Bratislavského samosprávneho kraja
- Pripravuje sa schválenie zastupiteľstvom obce Zálesie prevod práv projektovej dokumentácie na stavebníka Bratislavský samosprávny kraj

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Základné informácie:

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja, ktorý priamo koreluje so špecifickým cieľom výzvy 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zameraním výzvy "Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy". Prínosom projektu je zachovanie historickej hodnoty predmetného objektu Sýpky v súlade s aktuálnymi požiadavkami územia na riešenie dopadov klimatickej zmeny. Predmetom predkladaného projektu je 3. etapa celkového zámeru vybudovania Ekocentra Čunovo – rekonštrukcia NKP Sýpka Čunovo a jej adaptácia na ekocentrum. Sýpka bude funkčne a prevádzkovo dopĺňať činnosť envirovzdelávacieho centra (ekocentra) v objekte Kaštieľa a v okolitej záhrade. V objekte vznikne interaktívna expozícia zameraná na adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v regióne, doplnená o konferenčné priestory, slúžiace pre vzdelávacie programy.

Aktivity BSK:

1. Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
2. Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Relevantné cieľové skupiny:

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny s deťmi, školopovinné deti a mládež, domáci a zahraniční návštevníci, inštitúcie EVVO (environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta).

Výstupy projektu:

Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka NKP Sýpka Čunovo s výrazným znížením spotreby neobnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom obnoviteľného zdroja na prevádzku priestorov (tepelné čerpadlo, slúžiace na vykurovanie priestorov)

Zriadené konferenčné priestory a interaktívna expozícia, zameraná na zvýšenie povedomia v spoločnosti o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. S tým súvisí rozvoj vedomostí, zručností a zmien správania ľudí vedúcich k zodpovednému environmentálnemu správaniu so zreteľom na súčasný a budúci stav prírodných zdrojov a negatívnych dopadov zmeny klímy.

ochrana riešenej oblasti (areál Ekocentra vrátane Kaštieľa a záhrady) pred prívalovými povodňami a záplavami (vybudovanie dažďovej kanalizácie, akumulačných a vsakovacích nádrží a uličných vpustov), závlahová sebestačnosť prostredia (využívanie odvedenej vody do akumulačných a vsakovacích nádrží, následne využívanej na zavlažovanie vegetácie v areáli počas obdobia sucha).

Odhadovaný rozpočet projektu: 1 995 784,22 EUR

Spolufinancovanie BSK: 99 789,21 EUR (5%)

Trvanie projektu: 2024-2027

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo".

Aktuálny stav:

- Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer na rekonštrukciu Sýpky a expozíciu v interiéri.



Budúci areál Ekocentra

Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Gajary a Dürnkrut formou cyklolávky cez rieku Morava

Základné informácie:

Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi obcami Gajary a Dürnkrut, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými centrami, sa obyvateľom žijúcim na obidvoch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skráti čas dochádzky na priľahlé body záujmu v plánovanej cezhraničnej oblasti.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Gajary a Dürnkrut
2. Realizácia doplnkovej cyklistickej a vodáckej infraštruktúry

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom území, domáci a zahraniční návštevníci.

Celkový rozpočet projektu: 5 912 800,00 EUR

Rozpočet BSK: 4 022 320,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2023 - 12/2027


Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_16 pod názvom „Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Dürnkrut (AT) “.

Aktuálny stav:

- Prebiehajú bilaterálne rokovania so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o možnostiach realizácie tohto projektu v prebiehajúcom programovom období.

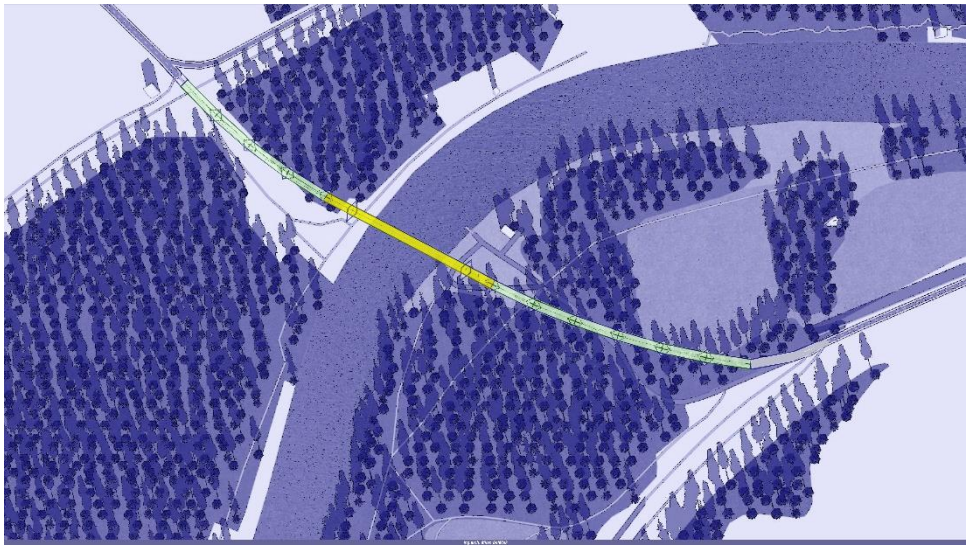

Revitalizácia kaštieľskeho parku v Stupave

Základné informácie:

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu a minimalizácie dopadov zmeny klímy

Aktivity BSK:

1. Úprava terénu v parku
2. Vyčistenie parku
3. Ošetrenie pôvodných drevín a výsadba
4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch
5. Reštaurátorské práce

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Stupava, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK.

Výstup projektu:

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Odhadovaný rozpočet projektu: 1 500 000,- EUR

Rozpočet BSK: -

Spolufinancovanie BSK: -

Trvanie projektu: 09/2018 – 12/2024

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSÚRaRP_8 pod názvom „Revitalizácia parku v Stupave“

Aktuálny stav:

- Projekčné práce boli ukončené a prebieha schvaľovanie na KPÚ

Rozvoj turistickej destinácie Morava

Základné informácie:

Zámerom je komplexný rozvoj turistickej destinácie v oblasti rieky Morava pomocou dobudovanie cykloturistickej a vodáckej infraštruktúry a zavedením jednotných pravidiel pre návštevníkov destinácie v súlade s ochranou životného prostredia a zachovaním unikátnej biodiverzity. Súčasťou projektu je aj tvorba destinačnej identity a marketingové výstupy.

Aktivity BSK:

1. Revitalizácia medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13
2. Budovanie cykloodpočívadla/drobnej architektúry
3. Zjednotenie informačných tabúľ pozdĺž rieky Morava

Relevantné cieľové skupiny:

návštevníci a obyvatelia BSK, domáci a zahraniční turisti (cyklisti, turisti, vodáci), deti a mládež, miestne komunity a záujmové združenia (športovci, kluby, lodenice, mimovládne organizácie), miestni malí a strední podnikatelia v cestovnom ruchu, neziskové organizácie zamerané na EVVO, ochranárske združenia, ...

Výstup projektu:

- vybudovaná/revitalizovaná turistické infraštruktúra poskytujúca možnosti trávenia voľného času pre návštevníkom a obyvateľov kraja
- zjednotenie pravidiel pre návštevníkom destinácie v súlade s obmedzeniami v závislosti od ochrany životného prostredia
- vytvorenie turistickej destinácie a marketingové výstupy; skvalitňovanie a rozšírenie ponuky cestovného ruchu
- organizácia podujatí s dôrazom na udržateľný cestovný ruch

Odhadovaný rozpočet projektu: 2 500 000,- EUR

Trvanie projektu: **01/2024 – 01/2027**

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektové aktivity sú zaradené do AP BSK č.OSÚRaRP_5 s názvom Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry

Aktuálny stav:

- prebieha komunikácia s možnými projektovými partnermi a tvorba ideového zámeru

Revitalizácia Malinovského parku

Základné informácie:

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použití technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Aktivity BSK:

1. Úprava terénu v parku
2. Vyčistenie parku
3. Ošetrenie pôvodných drevín a výsadba
4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch
5. Osvetlenie v parku

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia obce Malinovo, základné a stredné odborné školy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Odhadovaný rozpočet projektu: 2 500 000,00 EUR,

Trvanie projektu: 09/2018 – 12/2024

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSÚRaRP_9 pod názvom „Revitalizácia parku v Malinove“

Aktuálny stav:

- Z dôvodu dlhodobej absencie údržby zelene v Malinovskom parku, boli dreviny v havarijnom stave a vyžadovali si okamžitú asanáciu. Na ochranu zdravia a majetku, prebehol výrub a orez stromov.
- Projekčné práce boli ukončené a prebieha schvaľovanie na KPÚ



Park Malinovo

Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy

Základné informácie:

Projekt Danube Bike&Boat 2: Objavte Dunajské ostrovy predstavuje nadstavbu na úspešný projekt, ktorý bol ukončený v roku 2020, *Danube Bike&Boat: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne*. V tomto projekte sa spoločne vytvorili a nastavili ciele cezhraničnej turistickej destinácie Dunajské ostrovy a vybudovala sa infraštruktúra, etablovala sa marketingová značka, zmapovala sa existujúca základná ponuka služieb a bodov záujmu v destinácii. Napriek vybudovaniu pevných základov rozvoja atraktívnej a udržateľnej destinácie, vízia cezhraničnej destinácie s komplexnou ponukou služieb stále nebola kompletne naplnená.

Cieľom projektu Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy je zabezpečiť dostatočne zaujímavú a prepojenú infraštruktúru nielen pre domácu populáciu, ale aj zahraničných návštevníkov

- Posilniť existujúce a rozšíriť ponuku služieb na oboch stranách hraníc
- Zvýšiť bezmotorovú mobilitu v chránených územiach (stojiská)
- Zapojiť samosprávy, rozpočtové organizácie, súkromný a neziskový sektor do spoločných aktivít, aby každý mal záujem podielať sa na udržateľnosti výstupov a ďalšieho rozvoja v regióne (body záujmu)
- Zvýšiť bezpečnosť miestnych obyvateľov, komfort návštevníkov,
- Znížiť nežiadúce vplyvy na životné prostredie (stojiská; verejná doprava – shuttle bus, kompa; prepojenie cyklotrás; bike sharing; QR kódy namiesto tlačených brožúr...)
- Partneri projektu uvažujú nad zabezpečením udržateľnosti infraštruktúr či produktov CR spôsobom vyčlenených ďalších prostriedkov na bežnú údržbu, poistné krytie a pod,
- Turistické balíky, ktoré budú poskytované za finančnú odmenu (kompa, trailer, a pod..) budú vedené v účtovníctve osobitne, pričom zisk bude tvoriť prevažnú časť výdavkov spojených s prevádzkou a servisom

Aktivity BSK:

1. Výstavba cyklolávky Malinovo - Zálesie
2. Vybudovanie cyklotrasy Malinovo – Malinovo
3. Medzinárodná fotosúťaž
4. Komunikácia a koordinácia partnerstva

Relevantné cieľové skupiny:

- návštevníci a obyvatelia obcí Malinovo, Zálesie,
- domáci a zahraniční turisti (cyklisti, turisti, vodáci)
- mládež;
- miestne komunity a záujmové združenia (športovci, kluby, lodenice, mimovládne organizácie),
- miestni malí a strední podnikatelia v cestovnom ruchu,
- neziskové organizácie

Nepriama cieľová skupina:

- Galérie, múzeá
- Miestni tvorcovia lokálnych produktov - včelári, bylinkári, farmári, ...

Výstup projektu:

- skvalitňovanie ponuky produktov cestovného ruchu cez tvorbu turistických balíkov a tvorbu nových produktov; zosieťovanie miestnych aktérov cestovného ruchu prostredníctvom organizácie workshopov pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu
- budovanie cyklotrás, cyklolávky, náučných chodníkov, centrálneho prístaviska, revitalizácia návštevníckych centier a prezentačných miest lokálnych produktov.
- promo destinácie prostredníctvom influencerov, webovej stránky, fotosúťaže, akcií pre verejnosť
- Organizovanie umeleckých kempov

Odhadovaný rozpočet projektu: 5 000 000,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2025 – 06/2027


Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_12 aj OSURaRP_6.

Aktuálny stav:

- Oslovenie bývalých a hľadanie nových projektových partnerov, zisťovaniu záujmu a zľaďovanie vízií s predpokladanými podmienkami výzvy
- Účasť na stretnutiach projektových partnerov online aj na živo v Mosonmagyaróvári
- Vytvorenie užšej pracovnej skupiny KOCR v záujme harmonizácie cieľov a pomenovanie spoločných cieľov počas prípravného obdobia
- V rámci hlavnej aktivity cyklolávka Malinovo-Zálesie bolo vyhlásené VO na PD

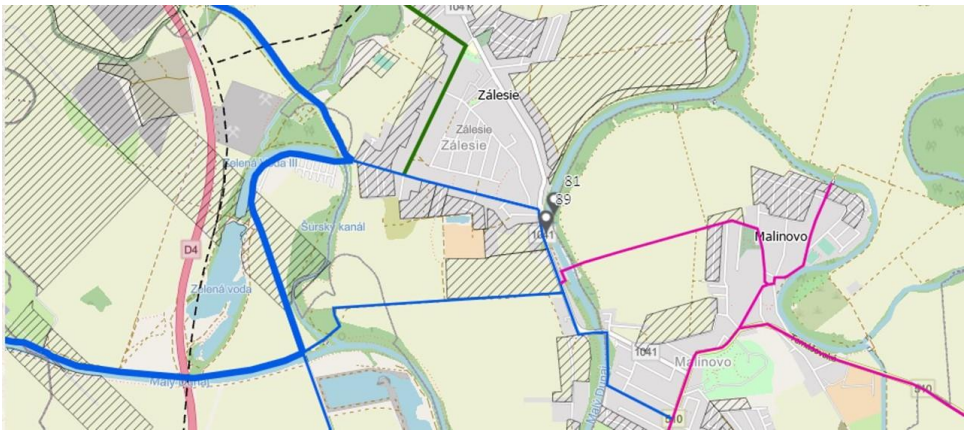

Súlad s cyklokoncepciou BSK



Vizualizácia cyklolávky Zálesie – Malinovo

UKONČENÉ PROJEKTY

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 2014-2020

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova združených dielní a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 2 764 415,45 EUR (v zmysle dodatku č. 7 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 138 220,77 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 407 171,34 EUR

Trvanie projektu: 12/2018 – 05/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 88/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:


Projekt bol zaradený do AP BSK 2022 č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“

Aktuálny stav:

- 26.05.2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie



Slávnostné otvorenie

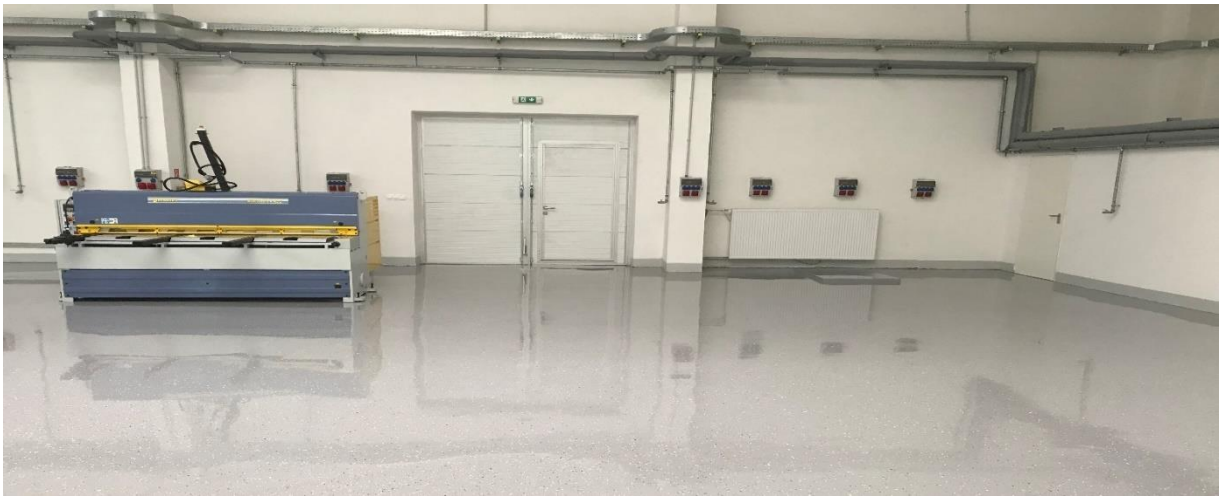

Rezačka plechov



CNC fréza



zrekonštruovaná učebňa

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruovali objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, boli obstarané nového materiálno – technického vybavenia (počítače, projektory, laboratórne stoly, schodolez) do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu :	1 402 873,96 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP)
Spolufinancovanie BSK:	70 143,70 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK:	238 160,83 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 12/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 86/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt bol zaradený do AP BSK 2022 č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava“.

Aktuálny stav:

- Projekt je fyzicky ukončený (12/2021)
- Záverečná žiadosť o platbu ako aj záverečná monitorovacia správa bola zaslaná na riadiaci orgán
- Stála tabuľa bola osadená v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
- V roku 2022 došlo k finančnému ukončeniu projektu



Stĺpová vŕtačka + stála tabuľa



Vybavenie kuchyne
